



Marina
Secretaría de Marina



**CORREDOR
INTEROCEÁNICO**
ISTMO DE TEHUANTEPEC

Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

Jueves 30 de octubre de 2025



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Interoceánico México



Marina
Secretaría de Marina

CORREDOR INTEROCEÁNICO
ISTMO DE TEHUANTEPEC



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Línea Z y FA



Operando para pasajeros y carga

- Línea Z: 22-dic-2023
- Línea FA: 13- Sep-2024

134,903 Pasajeros

889,920 Toneladas



2025
Año de
La Mujer Indígena

Ramal Roberto Ayala-Dos Bocas
90.84 km

Suburbano “El Tehuanito”



Objetivo: Establecer dos rutas de ferrocarril de pasajeros de lunes a viernes de bajo costo en **189 km**.

- **Tehuano Norte:** Ubero – Ixtepec - Ubero
- **Tehuano Sur:** Unión Hidalgo – Salina Cruz – Unión Hidalgo

NP	Estación	Avance %
Norte		
1	Ubero	34.48
2	Donají	100.00
3	Sarabia	44.46
4	Mogoñe	100.00
5	Matías Romero	100.00
6	Lagunas	80.00
7	Chivela	100.00
8	Nizanda	23.00
9	Ixtepec	100.00
Sur		
1	Unión Hidalgo	99.28
2	Juchitán	99.87
3	Espinal	99.18
4	Ixtepec	100.00
5	Comitancillo	81.00
6	Tehuantepec	78.00
7	Salina Cruz	100.00

**Operación
Diciembre 2025**




2025
Año de
La Mujer
Indígena

Complejo Matías Romero



Marina
Secretaría de Marina

**CORREDOR
INTEROCEÁNICO**
ISTMO DE TEHUANTEPEC

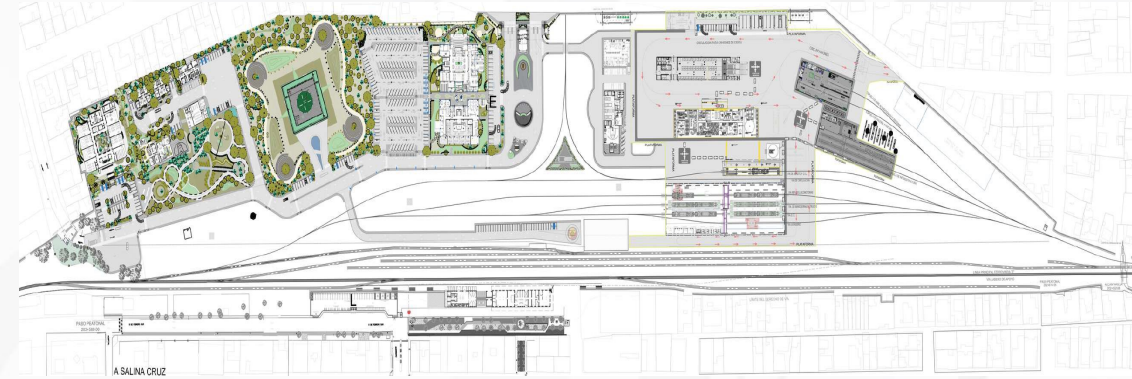

Conclusión:
Julio-2026

Avance: 55.12%



Centro Único Despacho



Edificios Administrativos



Centro de Capacitación



Talleres y Almacenes



Estación



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Vía de Penetración Roberto Ayala-Dos Bocas

90.84 kms.



Marina
Secretaría de Marina

CORREDOR INTEROCEÁNICO
ISTMO DE TEHUANTEPEC

ASIPONA Dos Bocas: 8.2 km



Refinería Olmeca: 13.5 km



PSV Cárdenas



1,766
Predios

- 1,106 Privados
- 153 Públicos
- 507 Sociales

Avance

- Liberación del DV 44.28%
- Inicio de Obra 10-Oct-25

Vías Férreas nuevas



Ramal RA-DB: 112.5 km



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Rehabilitación Línea K



Fecha de término:
Junio-2026



Obra	Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3	Total
Vías (km)	175	200	72	447
Estaciones	7	3	4	14
Puentes	162	204	71	437
Laderos	5	6	3	14
ODT's	212	275	139	626
Patios	1	0	2	3
Avance/término	99.44% Nov-25	79.23% Junio-26	84.36% Feb-26	87.68% Junio-26

Tramo 1
De Cd. Ixtepec a Tonalá

Tramo 2
De Tonalá a Huixtla

Tramo 3
De Huixtla a Cd. Hidalgo
KA: De Los Toros a Pto. Chiapas



Marina
Secretaría de Marina

CORREDOR INTEROCEÁNICO
ISTMO DE TEHUANTEPEC

Tramo 1
periodo de pruebas

- 26 de agosto de 2025
- 7,487 toneladas de carga

Estaciones Línea K




Marina
Secretaría de Marina

CORREDOR INTEROCEÁNICO
ISTMO DE TEHUANTEPEC



Avance general

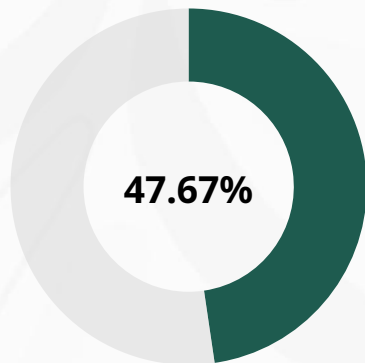

2025
Año de
La Mujer
Indígena



Línea K “Viaducto Huixtla”



Marina
Secretaría de Marina

**CORREDOR
INTEROCEÁNICO**
ISTMO DE TEHUANTEPEC

- Rampa de ascenso: **100%**
- Tramo central: **99.94%**
- Rampa de descenso: **99.90%**


1,500 empleos directos

Avance estructura:

99.95%



2025
Año de
La Mujer
Indígena

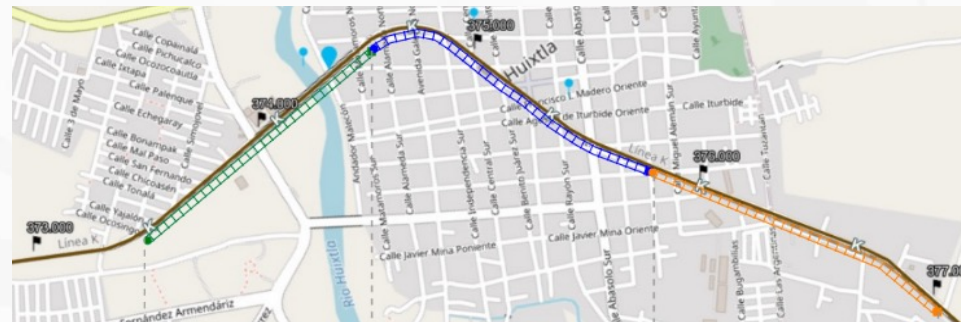

Parques lineales



Arriaga, avance 95.10%



Huixtla, avance 33.25%



Áreas recuperadas	Arriaga (m²)	Huixtla (m²)
Espacio público	12,064	28,541
Verdes	12,349	9,045
Deportivas	1,810	2,815
Reforestación	616 arboles 48,123 arbustos y herbáceas	515 arboles 34,351 arbustos y herbáceas
Superficie total	30,253	60,679



Puerto de Coatzacoalcos




Marina
Secretaría de Marina

CORREDOR INTEROCEÁNICO
ISTMO DE TEHUANTEPEC

Construcción de la UNAPROP-33, avance: 19.79%



Ampliación de la capacidad de vías Interior, avance: 44.71%

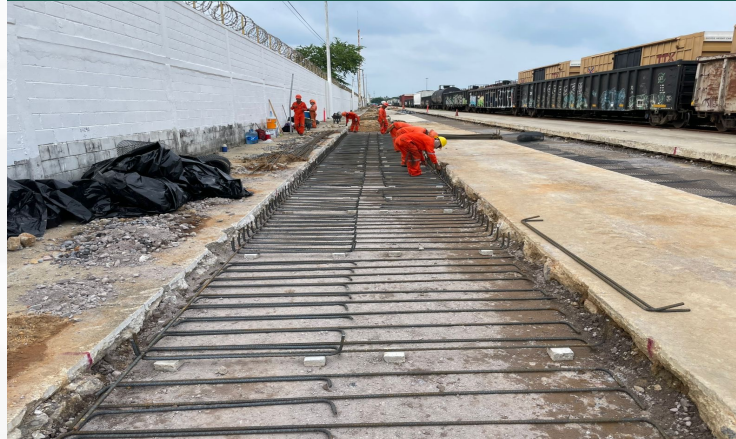

Ampliación de la capacidad de vías Exterior, avance: 20.04%



Terminal de Usos Múltiples 1ra. Etapa, avance: 97.77%



2025
Año de
La Mujer Indígena

Puerto de Salina Cruz

1

Dragado de construcción Terminal Comercial, avance: 87.37%



2

Centro Regulador de Tráfico, Estacionamiento, avance: 82.26%



3

Centro Regular de Vialidades, Acceso, Ruta Fiscal, avance: 43.33%



	Obras Nuevas	Avance
4	Ampliación de patio de contenedores	16.43%
5	Construcción del edificio de la ASIPONA	2.90%
6	Construcción de accesos principales	8.04%
7	Construcción del edificio de operaciones	14.10%
8	Construcción de tres silos y tres bodegas	4.97%



2025
Año de
La Mujer Indígena



Marina
Secretaría de Marina

CORREDOR INTEROCEÁNICO
ISTMO DE TEHUANTEPEC

Puerto de Dos Bocas



Marina
Secretaría de Marina



**CORREDOR
INTEROCEÁNICO**
ISTMO DE TEHUANTEPEC



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Puerto Chiapas



Marina
Secretaría de Marina

CORREDOR INTEROCEÁNICO
ISTMO DE TEHUANTEPEC

Construcción de Edificio Administrativo de la ASIPONA, Avance: 75%



Construcción de las escolleras del Puerto. Avance: 1.72%



Prolongación de vías férreas y Patio de ASIPONA, Avance 99%



2025
Año de
La Mujer Indígena



Polos de Desarrollo para el Bienestar



Incentivos federales

- Impuesto al Valor Agregado
- Impuesto Sobre la Renta
- Depreciación Acelerada

Incentivos estatales

- Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal
- Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos
- Impuesto para el Desarrollo Social
- Pago de Derechos



2025
Año de
La Mujer Indígena

PODEBIS	CONCESIONARIO
Coatzacoalcos I (257.70 ha)	Desarrolladora Multimodal del Istmo, S.A.P.I. de C.V.
Salina Cruz (82.09 ha)	
Coatzacoalcos II (131.82 ha)	Casarve Servicios, S. de R.L. de C.V.
Ixtaltepec "Chivela" (234.12 ha)	MARZAL Co Istmo S.A. de C.V. – Filial ARYZ
Texistepec (467.85 ha)	PROISTMO
Matías Romero "Donají" (185 ha)	
Santa María Mixtequilla (502.42 ha)	
San Juan Evangelista (360.25 ha)	
San Blas Atempa (331.53 ha)	ARYZ S.A. de C.V.
Ciudad Ixtepec (412.54 ha)	
Tapachula I (268.72 ha) y Tapachula II (149.71 ha)	En Adjudicación o licitación pública
Teapa Tabasco (100 ha)	En Proceso de declaración a PODEBI
Arriaga (49.6 ha)	




Atención territorial



Marina
Secretaría de Marina

CORREDOR INTEROCEÁNICO
ISTMO DE TEHUANTEPEC

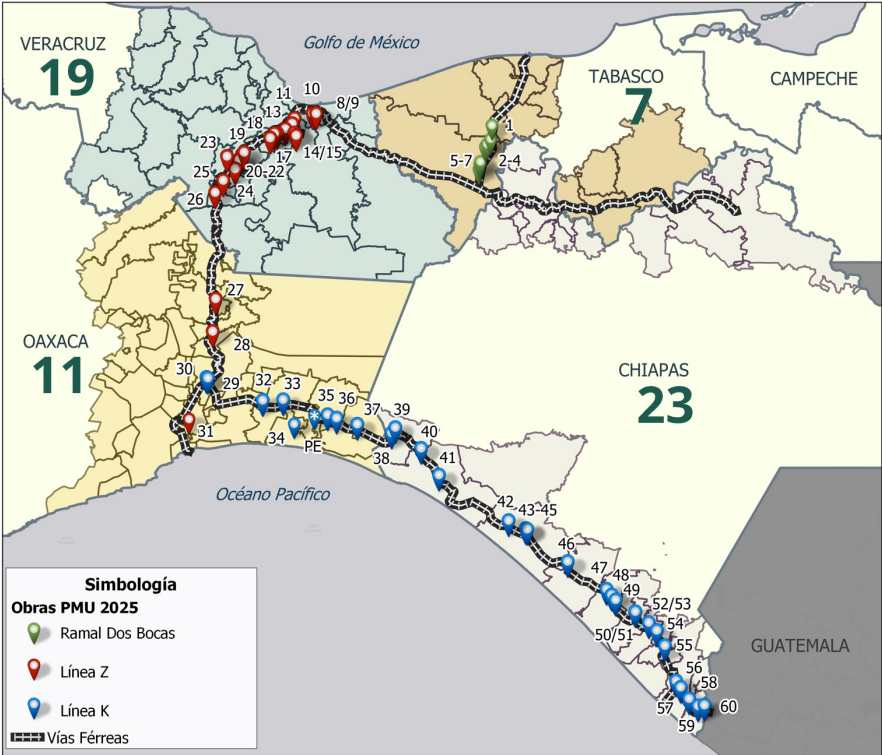

Evento	2025	Total
Obras comunitarias	60	150
Entrega de viviendas	1,738	4,029
Mejoramiento de viviendas	4,962	4,962
15 Dep. Federales Coordinadas	14,914 mdp	102,534 mdp



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Cruce Interoceánico



Marina
Secretaría de Marina

**CORREDOR
INTEROCEÁNICO**
ISTMO DE TEHUANTEPEC



2025
Año de
La Mujer
Indígena
